



Le 10 novembre 2017

**Compte rendu de travaux et cahier de présence des chantiers
du château de Calmont d'Olt - 12500 Espalion**

Sessions mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

1320 jours de chantier organisés en 2017

L'Association de Sauvegarde du Château de Calmont d'Olt a accueilli en 2017 :
108 personnes dans le cadre de ses chantiers de transmission de savoir-faire.
Les bénéficiaires sont des bénévoles internationaux des chantiers REMPART, des jeunes issus de foyers sociaux, des étudiants en stage d'architecture.
Ce travail d'insertion sociale et de formation de publics en difficulté est mené grâce aux encadrants techniques et aux membres de l'Association sur le Château de Calmont d'Olt, classé Monument Historique, l'objectif étant sa stabilisation.

Les bénévoles sont totalement pris en charge par l'association dès leur arrivée (Rodez ou Espalion) et durant tout le séjour : hébergement complet, intendance, repas, transport, encadrement, loisirs, etc....

Programmes d'animation réalisés avec les bénévoles :

Les bénévoles sont accueillis par une journée de sensibilisation à l'histoire et à l'architecture du château de Calmont d'Olt et une présentation participation aux animations médiévales.
Durant leur séjour, ils s'initient au tir à l'arc, à l'arbalète et aux différents ateliers proposés au public.

Durant les jours de repos, les volontaires découvrent l'histoire et l'architecture locales grâce à des visites autour du patrimoine roman, des châteaux et des villages classés avoisinant le site.
Des visites de musées (Soulages) ou de sites du Club des Sites sont aussi organisées.
Des activités de plein-air sont également proposées : initiation à la via ferrata, au tir à l'arc ou à la randonnée, tout comme des temps de détente et pique nique au bord du Lot, au lac ainsi que des soirées grillades autour d'un feu au château.

Les personnes accueillies participent aussi aux animations et aux soirées organisées à destination des jeunes publics ou des habitants du village, à Pâques, à la Toussaint et lors du feu de la Saint Jean. Ils sont aussi conviés à découvrir et participer à d'autres chantiers de patrimoine local.

NB : Les travaux engagés sur le Château de Calmont d'Olt Monument Historique Classé, ont fait l'objet de programmations concertées avec la DRAC :

Service Régional de l'Archéologie - M Laurent FAU -

Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine Mr BOULANGER

Retombées économiques :

Les retombées économiques sont importantes, puisque tous les approvisionnements, matériel, matériaux, intendance, entretien sont réalisés en circuit court sur le territoire local. La nourriture, (plus de 2600 repas et 1300 petits déjeuners) est achetée en produits frais à des producteurs locaux : légumes de l'AMAP, boulangeries, fromagers, boucherie, miel etc.

Développement touristique :

Les aménagements, expositions et animations qui sont proposés au public et aux scolaires dans ce Monument Historique, emblématique de la Vallée du Lot, n'auraient pu l'être sans les chantiers. La dynamique qu'ils représentent influe aussi sur la prise en compte locale de l'intérêt du patrimoine, elle sensibilise la population à son histoire. La présence en grand nombre de jeunes issus d'horizons différents et partageant la même passion crée un ciment social, la fidélisation sur nos chantiers et le retour de jeunes sur plusieurs sessions pendant plusieurs années en atteste.

Compte rendu des travaux réalisés en 2017 sur le château de Calmont d'Olt

1-Enceinte basse 15ème

Nous avons poursuivi la stabilisation de l'enceinte extérieure du XVème siècle.

- Tour Nord

Nous avons achevé les travaux entrepris l'an passé, à savoir la pose du linteau de calcaire sur l'archère 3 de la Tour. Nous avons rebâti le voutain de cette archère, le cintre en bois fut réalisé par nos soins, les pierres ont quant à elles été taillées et posées par les bénévoles. Ils ont également été impliqués dans la rehausse de trois assises au dessus du voutain, en maçonnerie de basalte. Les archères ont également été rejointoyées puis brossées.

-Tour Est

Il était urgent de sécuriser la maçonnerie de cette tour, le circuit de visite se trouvant en contrebas. Les archères 2 et 3 avaient quasiment entièrement disparues. Nous avons fait les relevés en fonction des pierres existantes au niveau de la première assise ainsi que des bouches à feu. Toutes les pierres des archères ont été taillées et posées par les bénévoles. Ils ont ainsi été initiés au calepinage, à la lecture de plans et de fiches de débit. Les linteaux en calcaire ont été taillés et posés. Le cintre pour le voutain de l'archère 3 est en place et les voussoirs ont été taillés et posés. Le mur en basalte de la tour a été stabilisé et rebâti de trois assises au dessus du linteau. D'ici la fin de l'année, nous espérons pouvoir achever la restitution du voutain de l'archère 2 et rejointoyer les archères ainsi qu'une partie de la maçonnerie.

-Courtines et sentier de visite

Les bénévoles ont désherbé les courtines à hauteur d'homme, évitant ainsi la prolifération de racines dans la maçonnerie, ce qui accélère sa détérioration. Ils ont également renforcé des marches constituées de rondins de bois et de terre autour de la Tour Longe et de la Tour Trompette pour faciliter et sécuriser le circuit de visite.

2-Porte de la Salière

-Piédroit gauche

Pour faire suite aux travaux de l'an passé où une assise avait été restituée afin d'avoir une meilleure lisibilité de la porte, nous avons rajouté une unique pierre et achevé cette ultime assise de façon ruiniforme. Un léger solin a été appliqué sur cet arrachement et les pierres ont été jointées. Cette dernière assise offre plus de clarté car elle suit le fruit du mur et permet de mieux visualiser l'existence d'une porte.

3-Haute cour

-Dégagement archéologique de la nécropole

Suite au dégagement de l'ensemble des sépultures de la haute cour dans le cadre de fouilles programmées en 2016, il était nécessaire de protéger le site. Il a donc été remblayé par une équipe de bénévoles avec de la terre tamisée au préalable.

-Le corps de logis

En 2015 le SRA avait souhaité un sondage du corps de logis, il en résulte la nécessité de vider complètement cet espace des 4 à 5 mètres de remblais l'encombrant. La pièce principale, la plus grande des trois, a ainsi été totalement décaissée jusqu'au niveau du rocher encore une fois avec l'aide de bénévoles. Cela a permis de mettre au jour dans leur ensemble les deux piédroits de la porte d'accès au corps de logis ainsi que quelques pierres qui s'apparentent à un escaliers descendants dans la grande salle.

Les deux pièces restantes seront décaissées durant l'année 2018.

Les portes du corps de logis

Les dégagements commencés en 2016 ont permis de mettre au jour des portes jumelles menant aux deux pièces de moindre taille.

Sur la porte de gauche subsistaient l'ensemble du piédroit gauche, le sommier d'arc (qui nous offrait de précieuses informations sur l'arc en question) ainsi que la majorité du piédroit droit. Il ne manquait seulement que les deux dernières pierres dans l'harpage de celui-ci. Les deux dernières assises du trumeau étaient également absentes. La porte de droite a beaucoup plus souffert. Son piédroit gauche montrait de grandes traces d'érosion. Son piédroit droit était écroulé. Seuls subsistaient une assise au niveau du sol et un sommier d'arc en très grande partie érodé. Mais ces pierres furent très importantes dans le relevé et nous ont permis de déduire que les deux portes étaient identiques (même largeur de baie, même hauteur de départ d'arc).

Nous avons ainsi calepiné l'ensemble. Le piédroit droit de la porte de gauche fut restitué ainsi que l'arc et son sommier droit. Les bénévoles ont ainsi été initiés au tracé d'une épure. Toutes les pierres du trumeau ont été taillées et posées (sauf la première du piédroit gauche de la porte de droite que nous remplacerons en tiroir lorsque tout l'ensemble sera restitué). Il en va de même pour le piédroit droit de la porte de droite qui a été totalement rebâti une fois les pierres taillées, seuil compris. L'ensemble a été jointé. L'arc de la porte de droite sera peut être achevé d'ici la fin 2017.

..Bâtiment A

La fouille de ce bâtiment a été faite en parallèle de celle de la cour en 2016. Elle a mis au jour un dallage, élément rare dans le château.

Suite aux recommandations des services de l'archéologie, ce dernier a été recouvert d'une couche de géotextile, d'une couche de sable et d'une structure en bois, type préau, afin de le protéger des aléas climatiques.


Suites envisagées :

La découverte récente d'une nécropole mérovingienne dans la haute cour du château, lève un voile sur une partie méconnue de notre histoire qu'il conviendra d'approfondir avec le SRA.

Un projet de stabilisation et d'étude de la Tour Longe (tour romane du 12ème siècle) est en cour avec la DRAC et un Architecte du Patrimoine.

Plusieurs années seront encore nécessaires à la stabilisation et à la prise de connaissance de ce Monument Historique Classé.

Localisation des chantiers réalisés en 2017 sur Calmont d'Olt

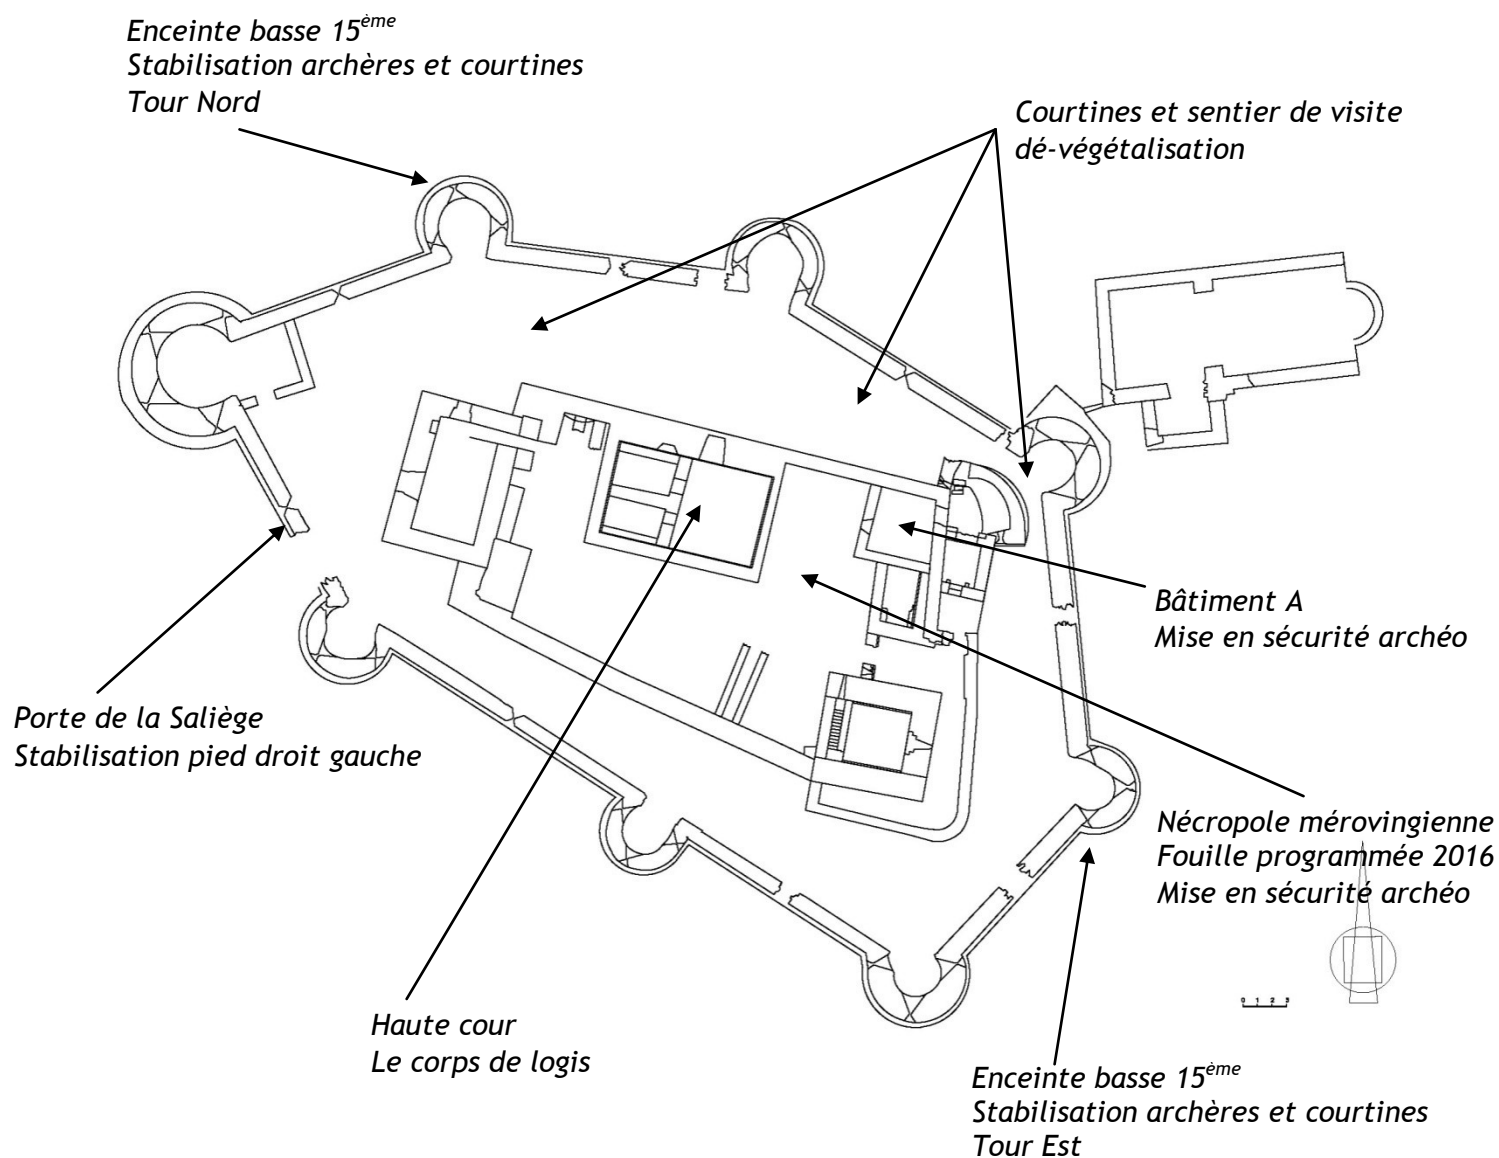

Chantiers 2017 tableau de fréquentation des groupes

Pour plus de détail voir les cahiers de présence par session joints en annexe

Session	Date	Bénévoles	Encadrants	Jours de chantier	Structure
mai	25/05 au 28/05	18	4	88	REMPART international
juin	10/06 au 25/06	17	5	368	REMPART international
août	09/08 au 20/08	38	5	456	Scouts de France BREST
Aout sept	28/08 au 10/09	11	3	192	REMPART international
octobre	28/10 au 05/11	24	4	216	REMPART international
TOTALUX		108	21	1320	

Soit 108 bénévoles de 3 nationalités accueillis en 2017, pour la réalisation au Château de Calmont d'Olt de 1320 jours de chantier.

Pays de provenance des bénévoles en 2017 :

France, Israël, Nederland


Encadrement des chantiers Origine et situation des animateurs pédagogiques et animateurs techniques:

- Présence temporaire pendant les sessions : de bénévoles indemnisés archéologues, anthropologue et charpentier tailleurs de pierre, hébergés et dont les frais de transport sont remboursés.
- Présence permanente de salariés: responsables de chantier, diagnosticien du bâtiment, maçons, tailleurs de pierre.

Hébergement et sanitaires mis à disposition des chantiers par l'association :

Couchage : 1 dortoir de 16 places + 1 studio de 3 chambres + 2 chambres
Salle conviviale : séjour, jeux de société, musique
Cuisine - salle à manger : 25 places, cuisine équipée cuisson gaz, four et frigos
Sanitaires en dur, eau chaude : 4 lavabos, 3 douches, 4 WC

Le Président de l'association



Michel VILLETARD

Monsieur le Maire d'Espalion
